


Aus betrieblichen Gründen (Personalauslastung im Winter) wurde die Fiale mit erheblicher Schräglage gegen Westen, ab Mitte Oktober in Eigenleistung eingerüstet und möglichst sorgfältig abgebaut.

Zwei schadhafte Schaftstücke aus „Zuger“ Sandstein wurden vom Münsterbaukollegium und den Restauratoren A. Walser und K. Durheim am 7. Dezember begutachtet.

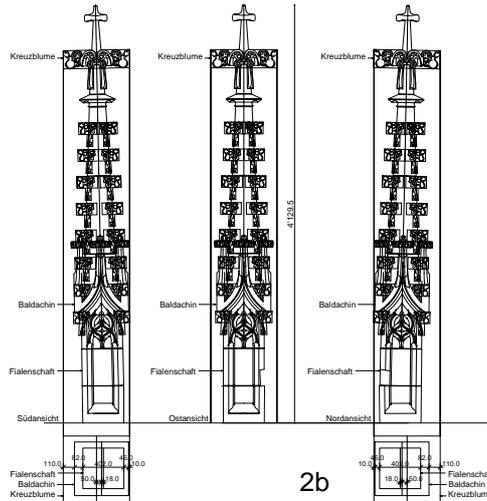

# Längsfassade

## Fiale IX-X, Süd

- 1 Entsalzung durch Fluten mit Wasser über die Weihnachtsferien
- 2a+b Massaufnahmen zur Ergänzung der CAD-Übung
- 3 Rissarmierung
- 4 Neues Schaftstück ausfräsen
- 5 Ausbohren
- 6 Nachbearbeiten von Hand
